ID		Task Name	Start	Finish
1		Design ROD test cards	Fri 9/1/00	Mon 10/16/00
2		ROD Fabricate Test Cards	Fri 11/17/00	Fri 12/1/00
3		Fab Proto ROD	Fri 9/1/00	Thu 10/19/00
4		Debug Proto ROD	Mon 10/23/00	Fri 12/15/00
5		ROD Update test stand SW	Fri 10/20/00	Fri 12/15/00
6		Fab TIM protot	Fri 9/1/00	Wed 9/20/00
7		Debug TIM Proto	Thu 9/21/00	Fri 12/15/00
8		Crate Purchase	Fri 9/1/00	Wed 11/1/00
9		Fabricate Crate Back Plane	Tue 10/24/00	Wed 11/8/00
10		Install BP in Crate	Wed 11/15/00	Wed 11/29/00
11		RCC Code Model	Fri 9/1/00	Tue 11/14/00
12		Links Hardware Available	Fri 9/1/00	Thu 2/1/01
13		Module Hardware Available	Fri 9/1/00	Thu 2/1/01
14		ROD Design Production Model	Tue 1/2/01	Thu 3/1/01
15		ROD Fabricate/debug 5 ea Proto	Tue 1/2/01	Thu 3/1/01
16		ROD Test stand software update	Mon 12/18/00	Mon 4/16/01
17		TIM design production model	Tue 1/2/01	Thu 3/1/01
18		TIM FAB/debug 5 ea Proto	Mon 1/15/01	Thu 3/1/01
19		ROD FAB/load/debug 2 ea PM	Fri 3/2/01	Wed 5/16/01
20		TIM Fab/load/test 2 ea.PM	Fri 3/2/01	Wed 5/16/01

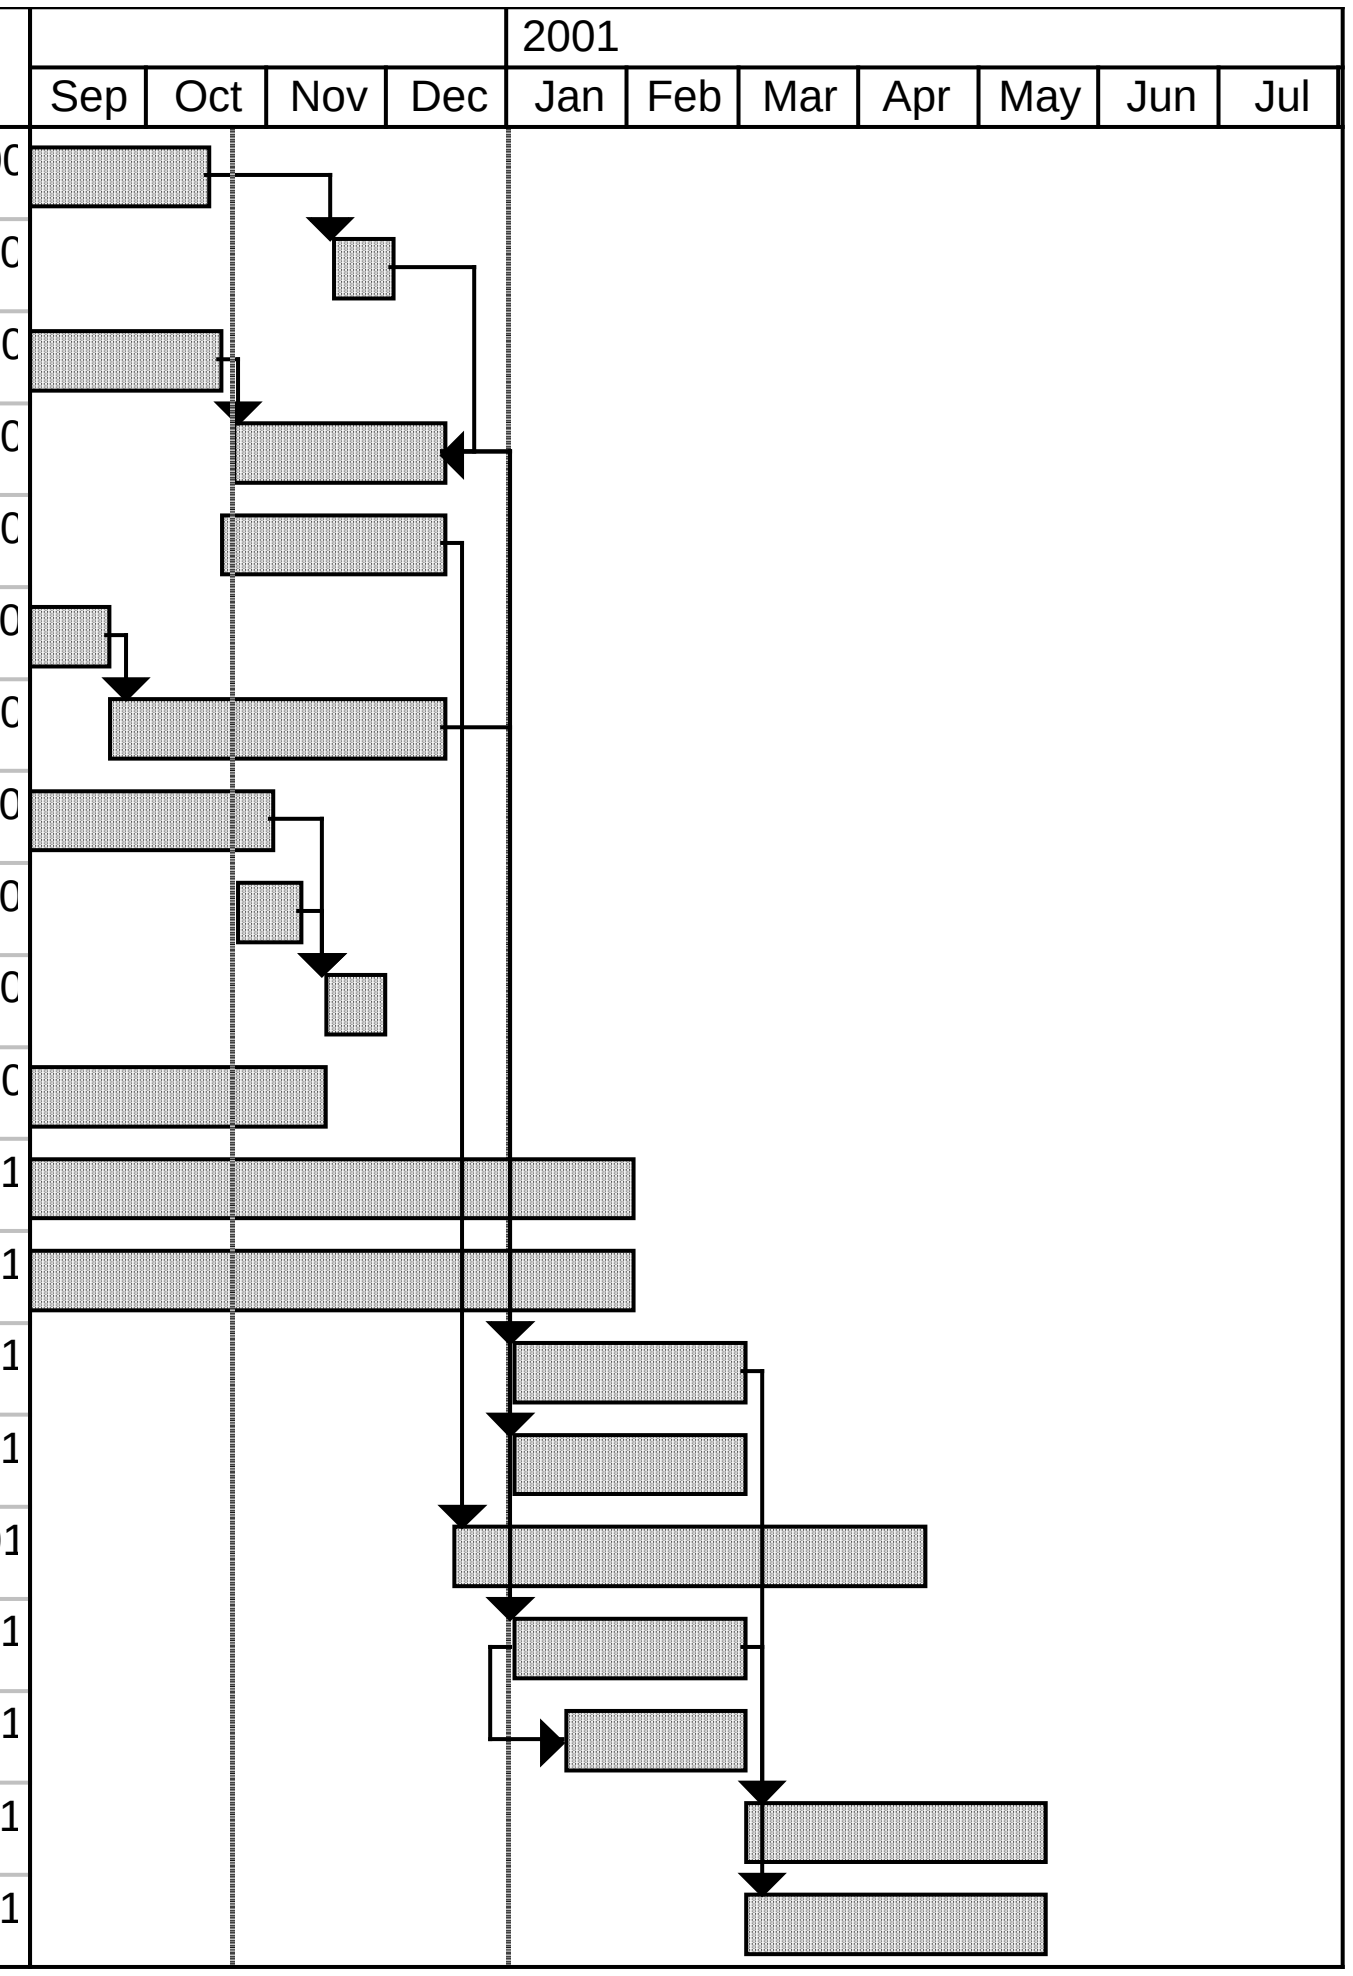

ID		Task Name	Start	Finish
21		BOC design Production model	Tue 1/2/01	Thu 3/1/01
22		BOC Fab 5 ea cards Proto	Thu 2/1/01	Thu 3/1/01
23		BOC Fab/debug 2 ea PM	Fri 3/2/01	Wed 5/16/01
24		DAQ Code Updating	Thu 2/15/01	Thu 3/15/01
25		DSP Code Update	Tue 3/13/01	Fri 4/13/01
26		BOC Design O-E & E-O	Mon 12/18/00	Fri 2/2/01
27		BOC Fab/debug 2 ea O-E & E-O	Mon 2/19/01	Mon 4/16/01
28		RCC Code System Test	Wed 11/15/00	Thu 2/15/01
29		Cambridge ROD Crate Test	Fri 1/5/01	Thu 3/1/01
30		CERN System Test	Tue 3/13/01	Thu 4/5/01
31		ATLAS Final Des Rev	Fri 4/6/01	Fri 4/6/01
32		Cambridge ROD Crate Test	Thu 5/17/01	Fri 6/15/01
33		PRR Design Review	Mon 8/13/01	Mon 8/13/01
34		5% Production All	Thu 8/16/01	Wed 11/14/01
35		CERN System Test	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
36		45% Production all	Mon 11/26/01	Fri 3/15/02
37		50% Production all	Wed 11/27/02	Tue 3/18/03
38		Installation and Repair All	Thu 10/4/01	Wed 1/2/02
39		Installation and repair All	Thu 1/3/02	Tue 10/1/02
40		Installation and repair Al	Wed 10/9/02	Tue 1/11/05

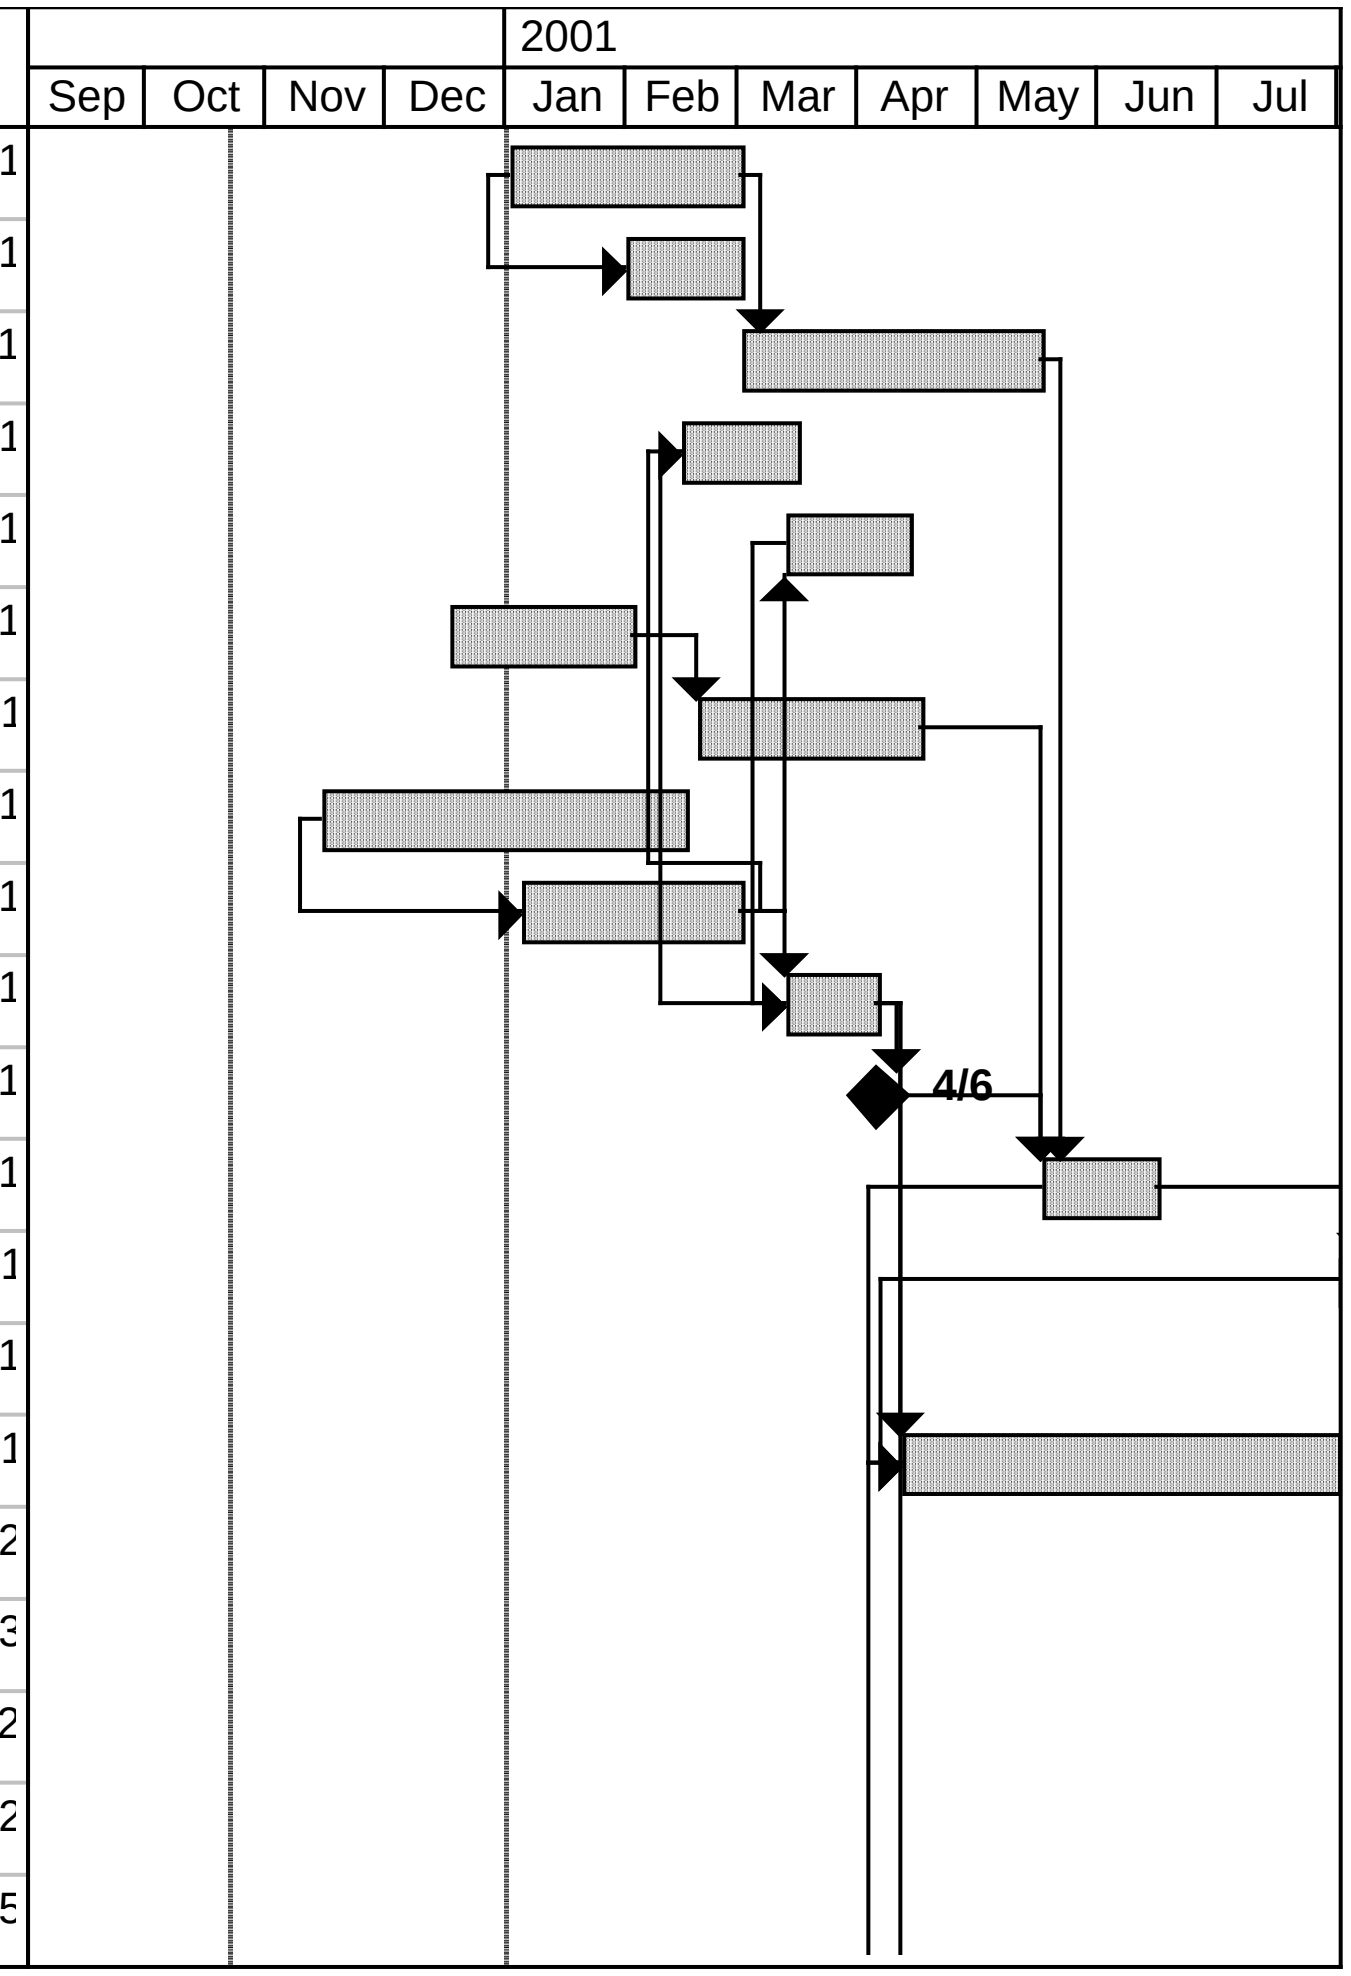

ID		Task Name	Start	Finish
41		Refine SCT DAQ	Tue 10/16/01	Sun 1/2/05
42		Refine Pixel DAQ	Tue 10/16/01	Fri 12/31/04
43		Finsh	Wed 1/12/05	Wed 1/12/05
44		Dev Code & test SCT & Pix DAQ	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
45		BOC proto fab	Fri 9/1/00	Fri 11/10/00
46		BOC Debug proto	Mon 11/13/00	Fri 12/15/00
47		BOC Des & Fab VME R/W csrd	Mon 10/2/00	Tue 10/31/00
48		BOC Code test stand SW	Fri 9/1/00	Thu 10/19/00

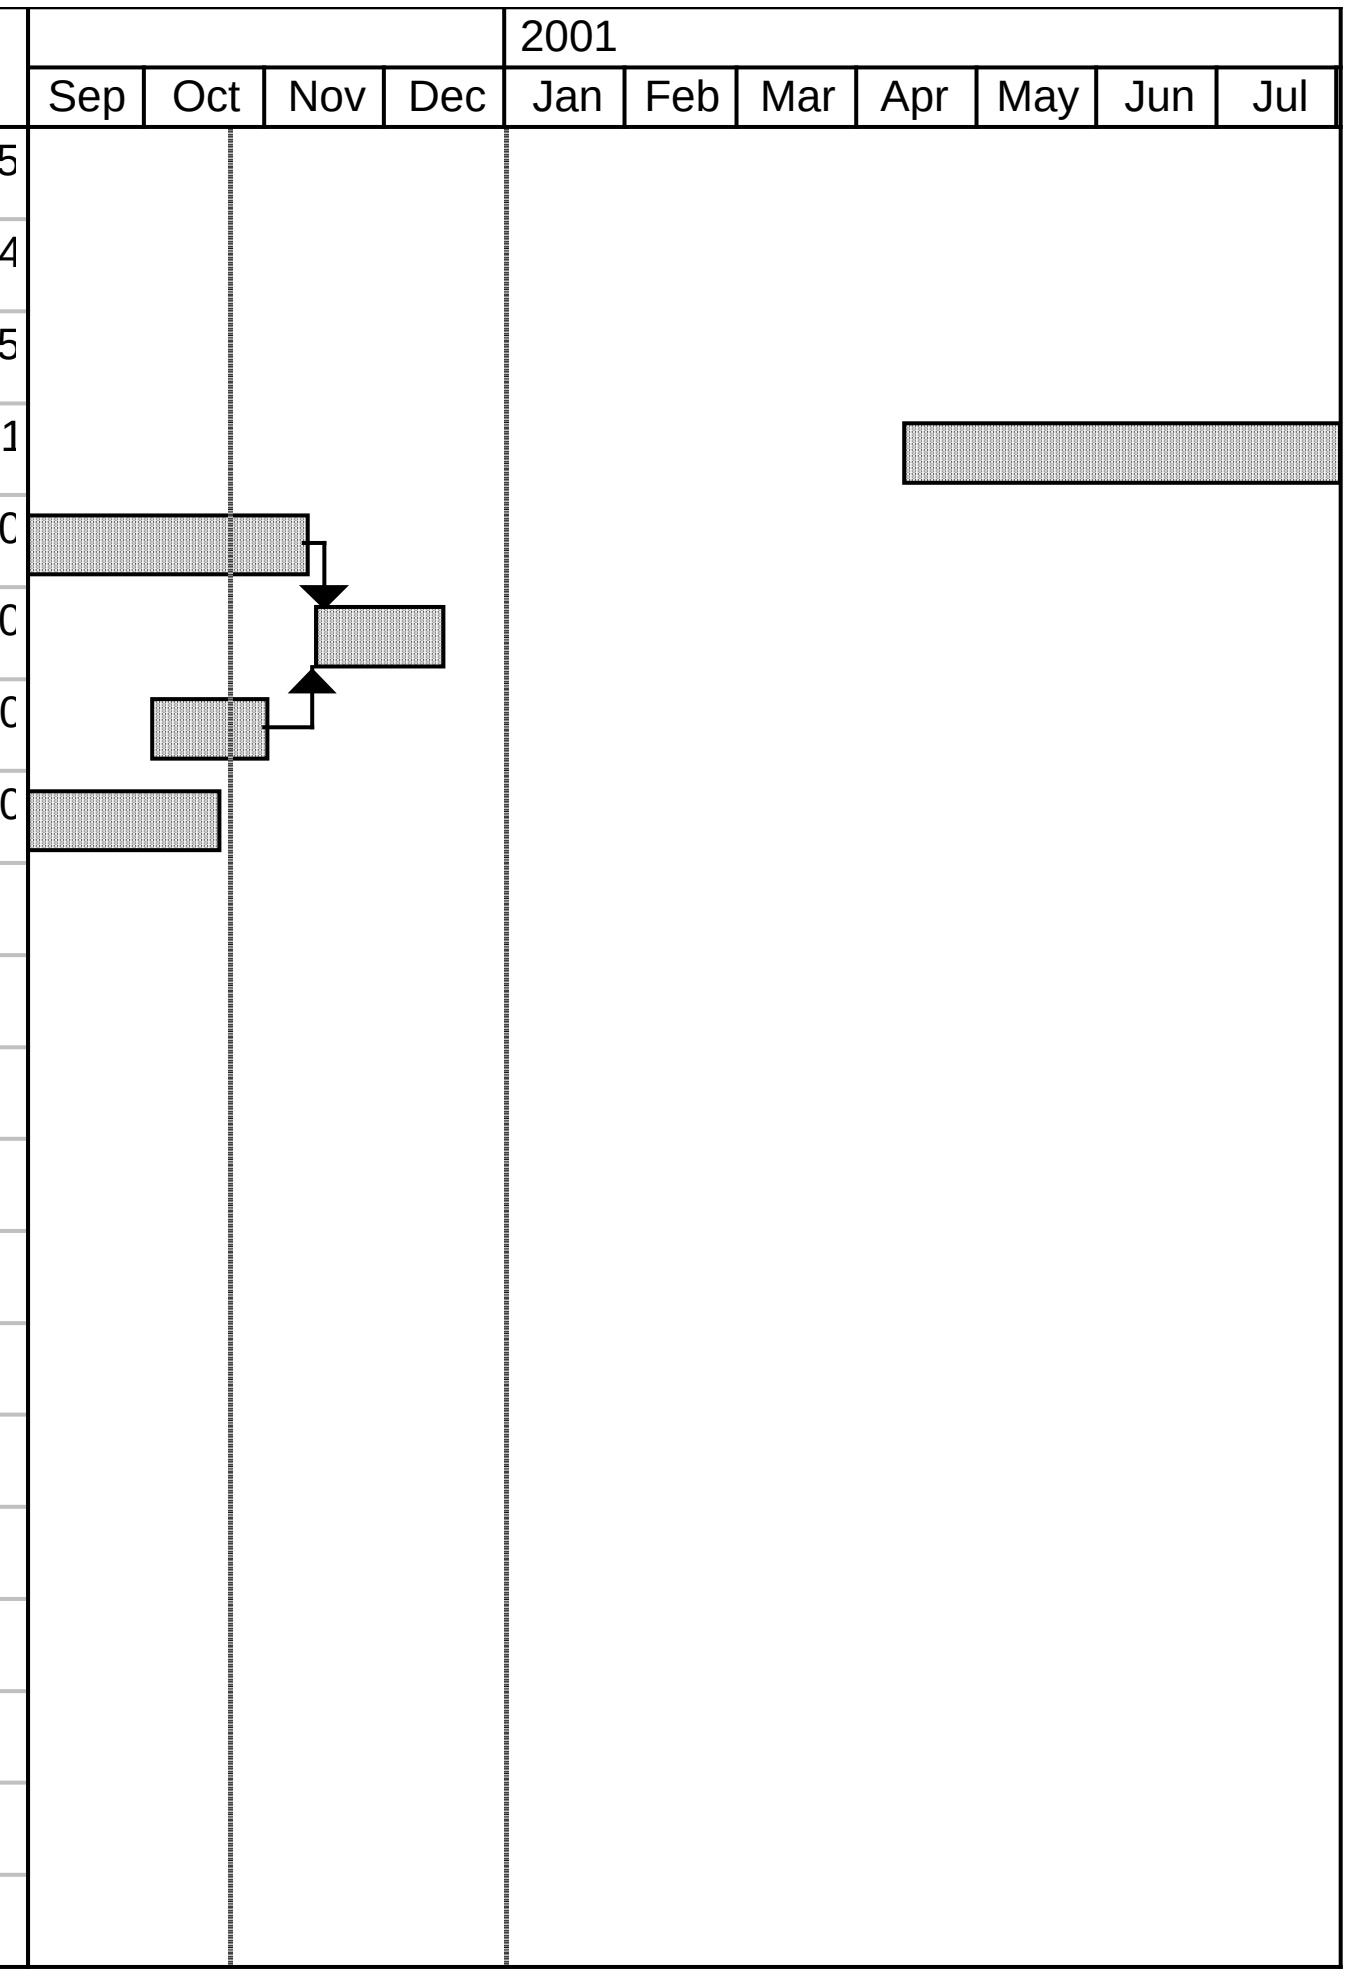

ID		Task Name	Start	Finish
30		CERN System Test	Tue 3/13/01	Thu 4/5/01
31		ATLAS Final Des Rev	Fri 4/6/01	Fri 4/6/01
32		Cambridge ROD Crate Test	Thu 5/17/01	Fri 6/15/01
33		PRR Design Review	Mon 8/13/01	Mon 8/13/01
34		5% Production All	Thu 8/16/01	Wed 11/14/01
35		CERN System Test	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
36		45% Production all	Mon 11/26/01	Fri 3/15/02
37		50% Production all	Wed 11/27/02	Tue 3/18/03
38		Installation and Repair All	Thu 10/4/01	Wed 1/2/02
39		Installation and repair All	Thu 1/3/02	Tue 10/1/02
40		Installation and repair Al	Wed 10/9/02	Tue 1/11/05
41		Refine SCT DAQ	Tue 10/16/01	Sun 1/2/05
42		Refine Pixel DAQ	Tue 10/16/01	Fri 12/31/04
43		Finsh	Wed 1/12/05	Wed 1/12/05
44		Dev Code & test SCT & Pix DAQ	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
45		BOC proto fab	Fri 9/1/0C	Fri 11/10/0C
46		BOC Debug proto	Mon 11/13/0C	Fri 12/15/0C
47		BOC Des & Fab VME R/W csrd	Mon 10/2/0C	Tue 10/31/0C
48		BOC Code test stand SW	Fri 9/1/0C	Thu 10/19/0C

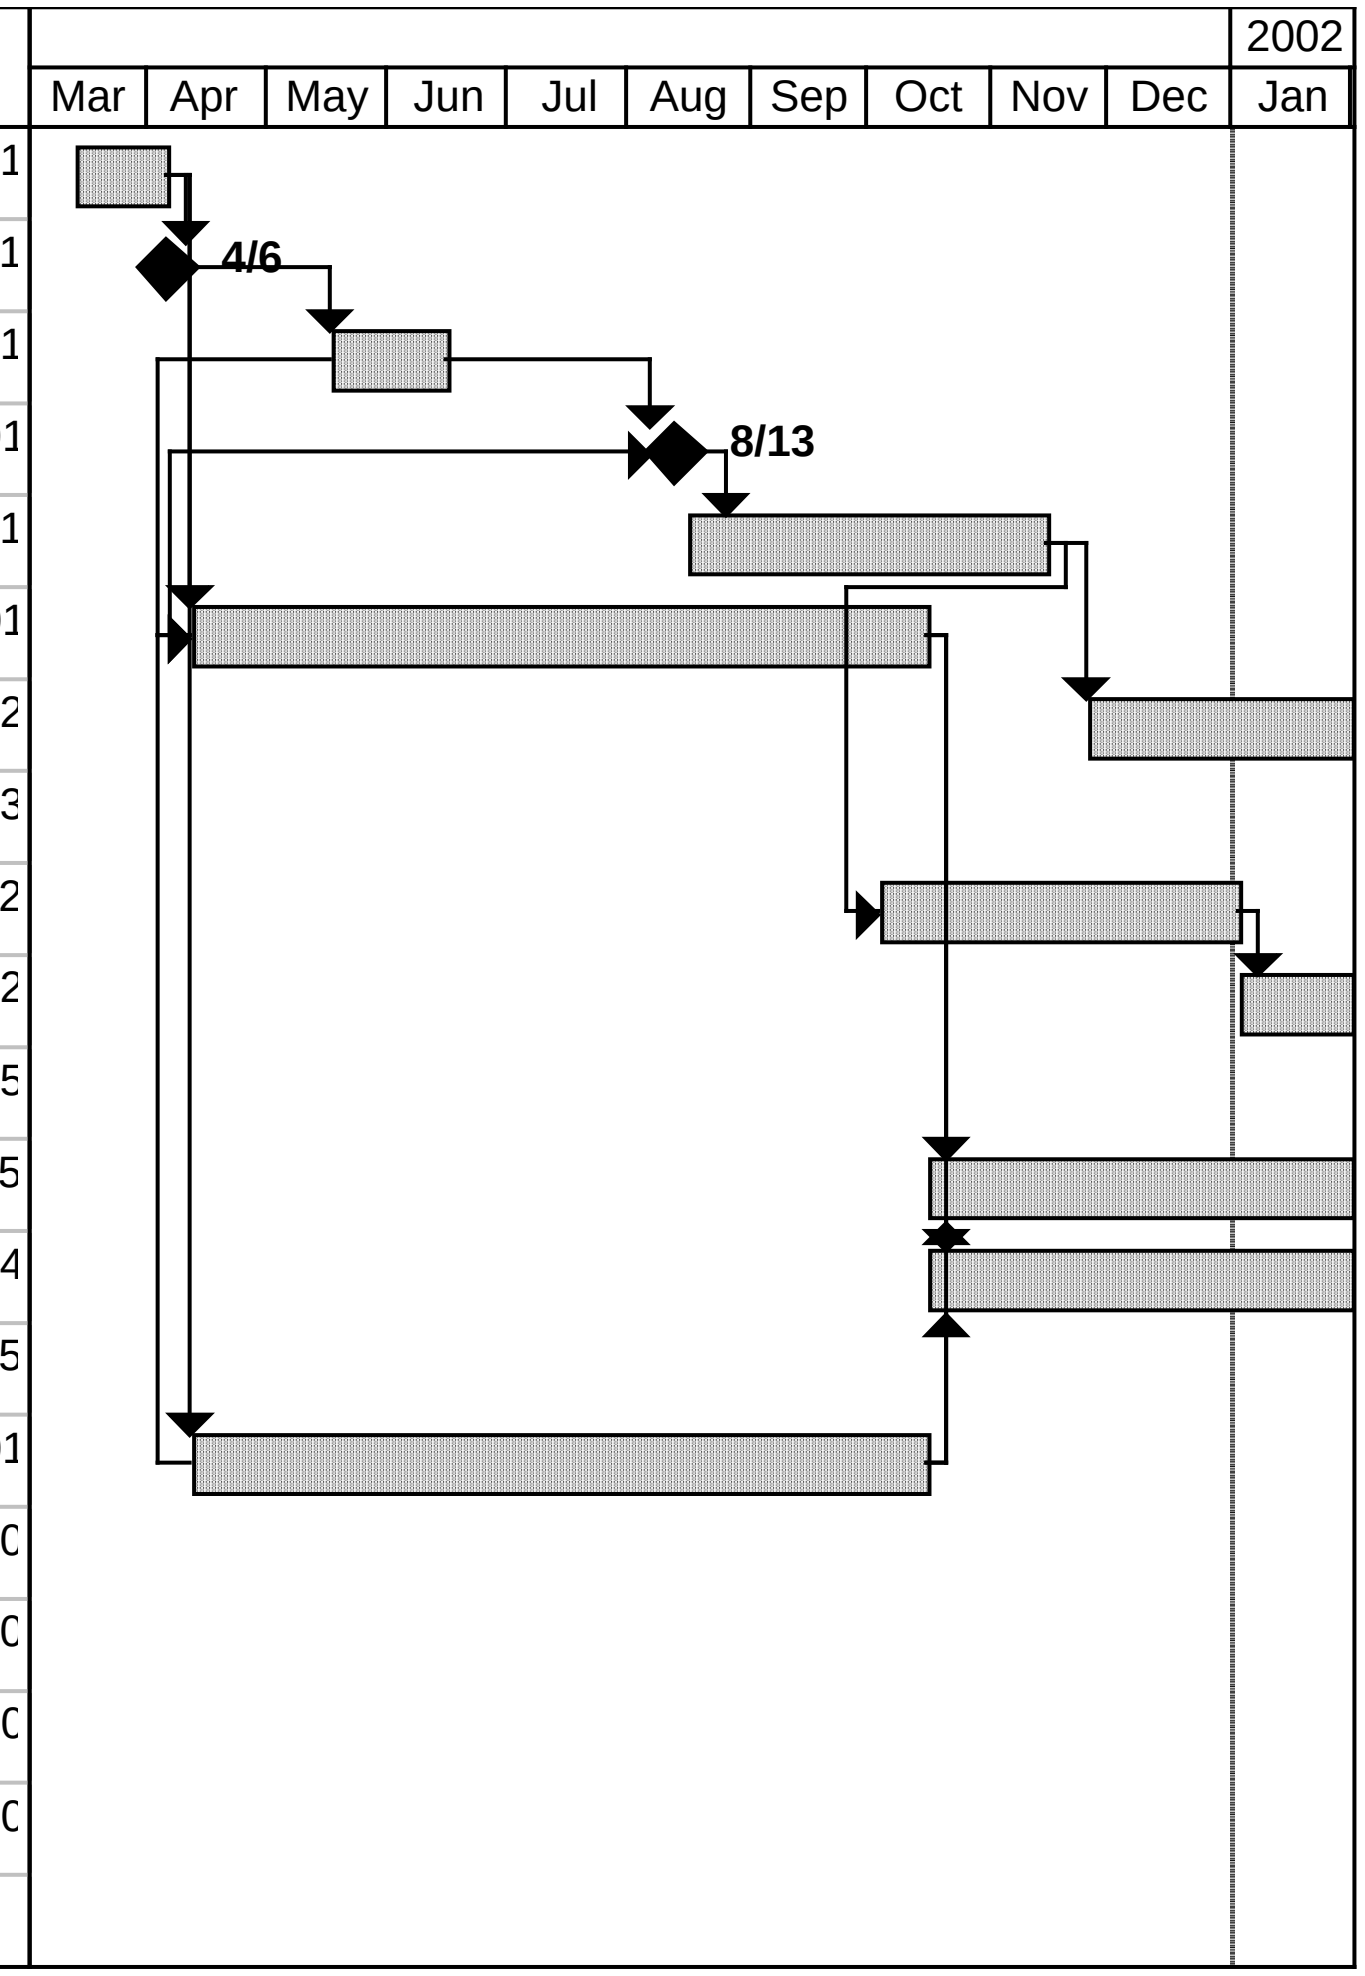

ID		Task Name	Start	Finish
30		CERN System Test	Tue 3/13/01	Thu 4/5/01
31		ATLAS Final Des Rev	Fri 4/6/01	Fri 4/6/01
32		Cambridge ROD Crate Test	Thu 5/17/01	Fri 6/15/01
33		PRR Design Review	Mon 8/13/01	Mon 8/13/01
34		5% Production All	Thu 8/16/01	Wed 11/14/01
35		CERN System Test	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
36		45% Production all	Mon 11/26/01	Fri 3/15/02
37		50% Production all	Wed 11/27/02	Tue 3/18/03
38		Installation and Repair All	Thu 10/4/01	Wed 1/2/02
39		Installation and repair All	Thu 1/3/02	Tue 10/1/02
40		Installation and repair Al	Wed 10/9/02	Tue 1/11/05
41		Refine SCT DAQ	Tue 10/16/01	Sun 1/2/05
42		Refine Pixel DAQ	Tue 10/16/01	Fri 12/31/04
43		Finsh	Wed 1/12/05	Wed 1/12/05
44		Dev Code & test SCT & Pix DAQ	Thu 4/12/01	Mon 10/15/01
45		BOC proto fab	Fri 9/1/00	Fri 11/10/00
46		BOC Debug proto	Mon 11/13/00	Fri 12/15/00
47		BOC Des & Fab VME R/W csrd	Mon 10/2/00	Tue 10/31/00
48		BOC Code test stand SW	Fri 9/1/00	Thu 10/19/00
